

建替工事工程計画

診療継続
 工事中
 仮囲範囲

① 一部解体工事 平成23年8月下旬～平成23年9月末(予定)

既存棟 全診療


- 既存附属棟一部解体



② I 期工事 平成23年10月～平成24年8月末(予定)

既存棟 全診療


- 現駐車場に北棟建設 (I 期工事範囲)
- 南側敷地に南棟建設

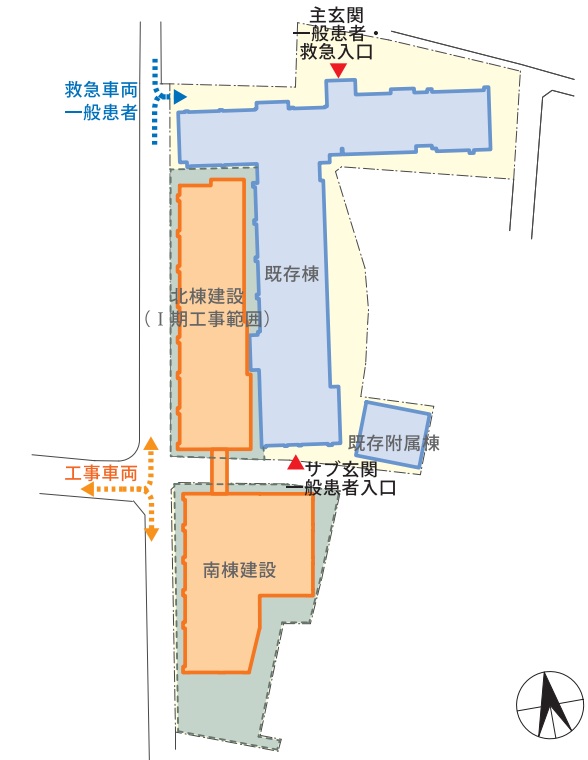

③ II 期工事 平成24年9月～平成26年1月末(予定)

新棟 診療開始
(外来・入院約99床)
既存棟一部稼働

- 既存棟一部解体後北棟建設 (II 期工事範囲)

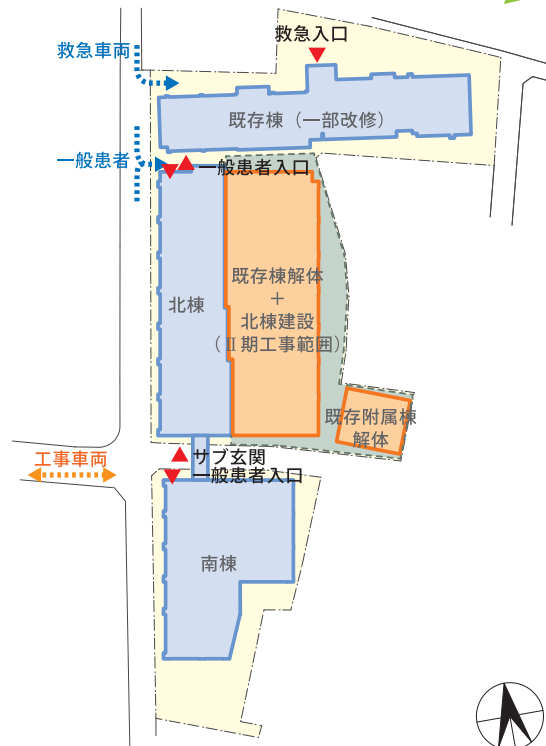

④ III 期工事 平成26年2月～平成26年11月末(予定)

新棟 全診療
(入院115床)

- 既存棟解体外構工事

